

운촌항 수질개선

공약목표	○ 운촌항 내 준설을 통한 악취민원 해소				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	해양진흥과	담 당 자	이 세 훈	전화번호	4664

① 사업개요

- 위 치 : 해운대구 우동 운촌항 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업규모(내용) : 해저오염토준설 V=18,000m³
- 총사업비 : 1,800백만원(구비: 1,800)

2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

[illegible]

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
운촌항 준설공사	1,2,3공구 준설		-	-	-

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
준설량	m ³	목표	-	18,000	-	-	-
		실적	-	-	-	-	-

⑤ 이행실적(주요성과)

- 운촌항 준설공사 실시설계 및 각종 시험용역 완료
 - 운촌항 준설공사 실시설계, 해양공정시험, 생태독성시험, 폐기물시험, 토양오염도시험 등
- 공유수면 점용·사용허가 및 실시계획 승인 등 행정절차 완료
- 운촌항 준설공사 착공(※ 착공일: '22.12.21.)

⑥ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

⑦ 향후계획

- 2023. 3. 20. : 운촌항 준설공사 준공

⑧ 관련 자료

- 위치도 및 현장사진 참조

위치도 및 현장사진

위 치 도

운촌항 준설

$V=18,000\text{ m}^3$



현 장 사 진



해변산책로 조성

공약목표	○ 마린시티~동백섬(운촌항) 일원 친수연안(해변산책로) 조성				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	기타[미착수]
담당부서	해양진흥과	담 당 자	이 세 훈	전화번호	4664

① 사업개요

- 위 치 : 해운대구 우동 마린시티~동백섬(운촌항) 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업규모(내용) : 친수연안(해변산책로) 조성 L=700m
- 총사업비 : 1,700백만원(구비: 1,700) (※ 기투자: 특교세 300백만원)

2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

[illegible]

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
마린시티~동백섬 해변산책로 조성	기본계획(안) 마련	권리관계 정리	실시설계	착공 및 준공	-

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
연차별 추진계획	-	목표	기본계획(안) 마련	권리관계 정리	실시설계	착공 및 준공	-
		실적	진행중	-	-	-	-

⑤ 이행실적(주요성과)

- 동백교~동백출장소 간 해변산책로 140m 기 조성 완료
- 마린시티~동백섬 친수연안조성 타당성 및 기본계획 수립 용역('20년) 및 연안관리계획 수립 용역('23. 3. 완료예정)

⑥ 문제점 및 대책

- 사업구간이 외해로 노출되어 있어 태풍 등 재해로 인한 시설물 및 인명 피해 지속
 - '22. 9. 제11호 태풍 「힌남노」 상륙 시 해변산책로 기 조성구간(L=140m) 및 인근 도로 파손
 - 해변산책로 추가 설치 시 지속적 파손 및 안전사고 우려로 각종 피해 증대
- 방파제 등 재해 예방을 위한 방재시설 등 주민 안전 확보 후 설치 검토 필요
 - 방파제 설치는 막대한 예산이 수반되는 사항으로 장기적 검토가 필요함
 - 수영만 자연재해위험개선지구에 인접하여 산책로 설치 전 재해예방대책이 우선임
- 해변산책로 사업은 당장은 시행이 어려우며, 위치 및 사업내용 변경 등 대안을 종합적으로 검토 예정

⑦ 향후계획

- 구청장 공약사항 변경 협의 ☞ 기획조정실
 - 해변산책로 사업계획 조정(위치 및 사업내용 변경 등) 검토


8 관련 자료

위치도 및 현장사진


위 치 도



현 장 사 진

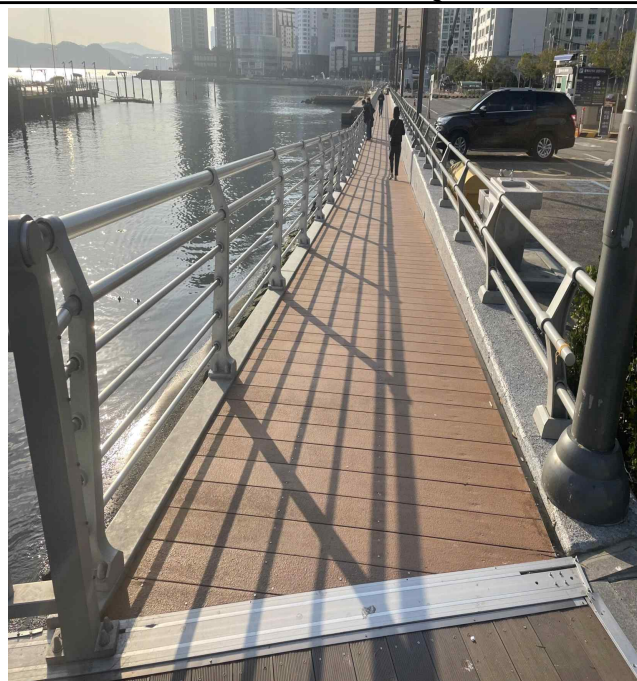

기 조성구간 L=140m

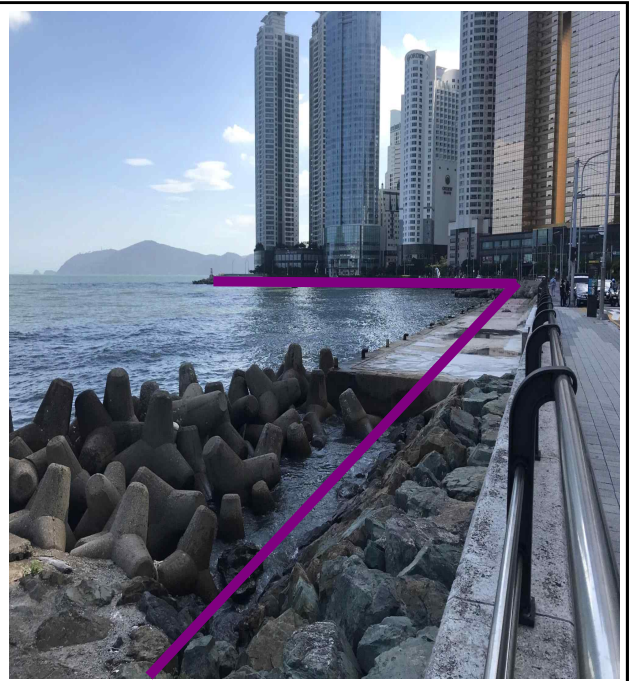

계획구간 L=560m

운촌항 수질개선 및 해변산책로 조성 (춘천 하류부(동백섬 일원) 악취해소 사업)

공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동백섬 일원 고질적인 악취 해소를 위한 준설 및 차집시설 정비사업 추진 ○ 건설과 추진중인 운촌항 준설사업 효과제고, 하천 내 오염원 유입 원천 차단 				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	필 요	추진상황	정상추진
담당부서	건 설 과	담 당 자	김하빈	전화번호	6031

① 사업개요

① 춘천 복개BOX 악취 개선공사 실시설계용역

- 용역비: 금6천만원
 - 용역기간: 2022. 2. 24. ~ 2022. 7. 23. (용역일시정지 : 2022.07.20.)
 - 용역내용: 차집시설 설치 등 실시설계 1식
 - 추진경과
 - 2022. 2. 24.: 용역 착수
 - 2022. 3. 21.: 착수보고
 - 2022. 6. ~ 7.: 정비계획(안) 부산시 및 환경공단 협의
 - 2022. 7. 20.: 용역 일시정지
- ※일시정지 사유: 정비계획(안)에 대하여 부산시 및 환경공단에 설계단계 협의 필요

② 춘천 복개BOX 내 오수유입 차집시설 설치공사

- 위 치 : 춘천 하류부(동백섬 일원)
 - 사업기간: 2023. 1. ~ 7.
 - 사업내용: 격면보강 및 차집시설 등 설치
 - 사업비: 금8억3천3백만원
- ▶ 총사업비: 9억원[용역비 6천만원/공사비 8억3천3백만원/구비100%]

② 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액 (예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	900			900		900 (41)			900 (41)	
2022년	900			900		900 (41)			900 (41)	
2023년										
2024년										
2025년										
2026년										

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년		2023년	2024년	2025년	2026년 이후
춘천 하구 악취저감시설 및 관리시스템 구축사업	실시 설계 용역	공사 추진	공사추진 및 공사완료	준설 및 일반 유지관리		

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
춘천 하구 악취저감시설 및 관리시스템 구축사업	%	목표	10	100			
		실적	10	100			

⑤ 이행실적(주요성과)

- 춘천 복개BOX 악취 개선공사 실시설계용역 착수
- 춘천 복개BOX 악취개선공사 공사 발주

⑥ 문제점 및 대책


- 「건설기술진흥법」 제62조, 시행령 제75조에 따른 설계의 안전성 검토 대상 사업에 해당하여 추가과업 수행이 필요함. (현재 추가과업 수행 중)

⑦ 향후계획

- 공사 착공 및 준공
- 시설물 관리이관

⑧ 관련 자료

위치도

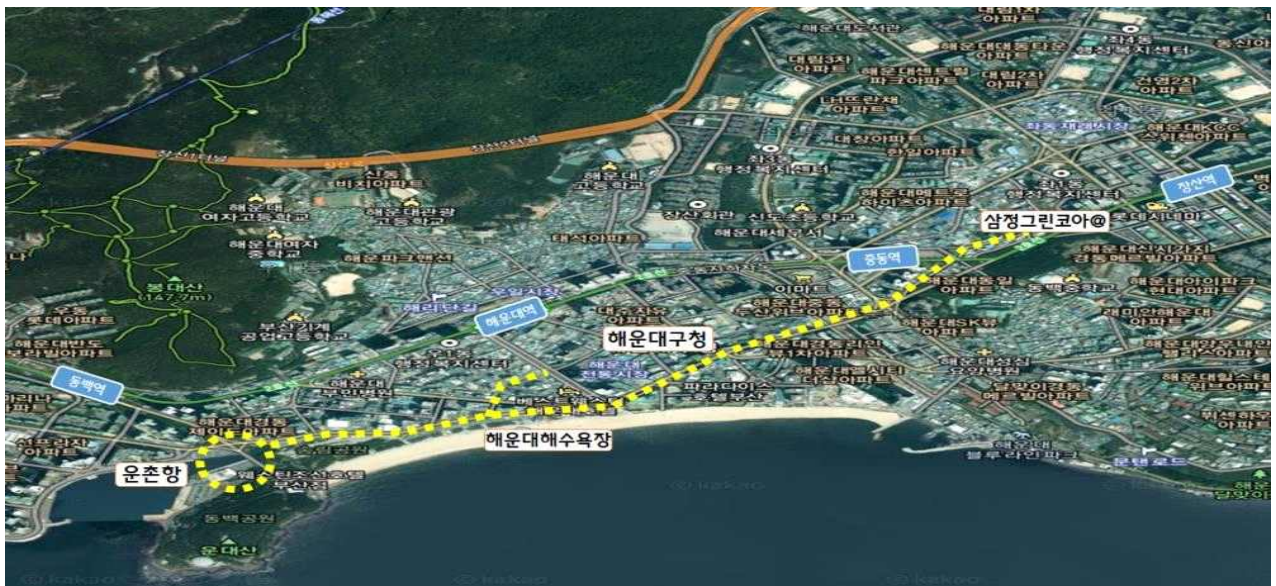

현장사진

