

반여 휴 여가복지 조성

공약목표	○ 반여3동 초록공원 주변 임야에 테마가 있는 공간을 조성하여 지역 주민들에게 보다 나은 친자연 명품 산림휴양공간 제공				
사업기간	임 기 내	사업구분	신 규	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	늘푸른과	담 당 자	노 주 석	전화번호	4482

① 사업개요

- 위 치 : 반여동 산4-10 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 10.
- 사업규모(내용) : A=26,000㎡, L=1.5km
 - ▶ 맨발 황톳길 조성, 친자연 어린이 숲체험장 및 어르신 이바구쉼터 등 편의공간 조성, 산책로 및 산지계류 정비 등
- 총사업비 : 1,000백만원(국비90% 구비10%)

2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

[illegible]

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
반여 휴 여가녹지 조성사업	설계예산 확보 및 용역계약 체결	실시설계용역 시행 및 완공	시설 사후관리		

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
사업 추진율	%	목표	-	100%			
		실적	-	-			

⑤ 이행실적(주요성과)

- 2023년 개발제한구역 주민지원사업 신청 및 최종 선정(국비8억 확보)


⑥ 문제점 및 대책

- 여가녹지 내 다양한 연령층의 이용 행태를 고려한 다채로운 시설 조성
 - 맨발 황톳길, 친자연 어린이 숲체험장 등 타 지자체 벤치마킹 사례 적용
 - 주민설명회, 현장설문 등 주민의견 수렴하여 실시설계용역 반영

⑦ 향후계획

- 2023. 1. ~ 4. : 실시설계용역 및 개발제한구역 행위허가 등 행정절차 이행
- 2023. 5. ~ 10. : 반여 휴 여가녹지 조성사업 도급공사 시행

8 관련 자료

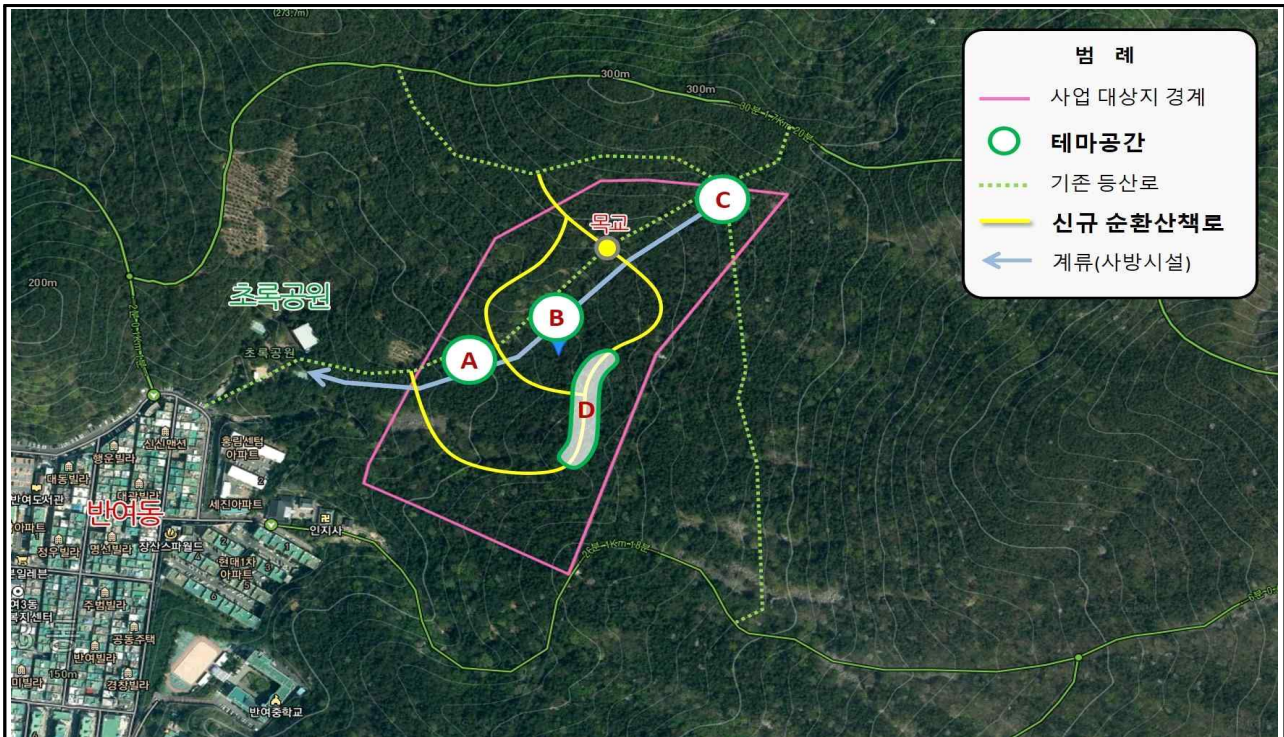

사업대상지 위치도 및 조성계획도



현장사진
