

5-3

미포항, 청사포항, 송정항 정비사업 추진

공약목표	3포항(미포,청사포,송정) 의 주민 및 관광객들의 안전한 어항 환경을 구축하고자 함				
사업기간	임 기 내	사업구분	신 규	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	필 요	추진상황	정상추진
담당부서	해양진흥과	담 당 자	전 영 빈	전화번호	4502

① 사업개요

- 위 치 : 미포항, 청사포항, 송정항
- 사업기간 : 2022년 ~
- 사업규모
 - ▶ 미포항 어항 정비(안전한 어항시설 구축)를 위한 어항개발계획 수립·고시
 - ▶ 청사포항 어항시설(방파제 연장 등) 통합 정비 및 안전한 어항 환경조성
 - ▶ 송정항 어항 정비(안전한 어항시설 구축 등)를 위한 어항개발계획 수립·고시
- 총사업비(청사포항 어촌뉴딜300사업)
 - ▶ 10,031백만원(국비: 6,958.7, 시비: 1,491.15, 구비: 1,491.15, 자부담:90)
 - 2020년 사업비 : 1,688백만원 / 2021년 사업비 : 4,774백만원 / 2022년 사업비 : 3,479백만원

② 예산 확보 및 집행 내역(청사포항 어촌뉴딜300사업)

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액 (예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	3,479	2,435	313	731	-	3,479 (3,479)	2,435 (2,435)	313 (313)	731 (731)	-
2022년	3,479	2,435	313	731	-	3,479 (3,479)	2,435 (2,435)	313 (313)	731 (731)	-

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
미포항 어항개발계획 수립	불법매립지 원상회복 의무면제 협의	어항개발 계획수립·고시	어항 정비	어항 정비	어항 정비
청사포항 어촌뉴딜300사업	방파제 연장 공사를 위한 행정 절차 이행 완료	어촌뉴딜사업 준공	어항 정비	어항 정비	어항 정비
송정항 어항개발계획수립	어항개발계획 관계기관 협의	어항개발 계획수립·고시	어항 정비	어항 정비	어항 정비

4 공약달성 확인 지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
미포항 어항개발계획 수립·고시	%(공정률)	목표	불법매립지 원상회복 의무면제 협의	100	-	-	-
		실적	면제 협의 완료		-	-	-
청사포항 어촌뉴딜300사업	%(공정률)	목표	공유수면 점·사용 협의, 실시계획 신고	100	-	-	-
		실적	협의 및 신고 완료		-	-	-
송정항 어항개발계획 수립·고시	%(공정률)	목표	-	100	-	-	-
		실적	-		-	-	-

5 이행실적(주요성과)

- (미 포 항) 어항개발계획 수립을 위한 불법매립지(공유수면) 원상회복 의무면제 협의 완료(중동 1015-9번지 일원 육상기능시설, 900m²)
- (청사포항) 어촌뉴딜300사업 토목공사(서방파제80m)연장을 위한 공유수면 점용·사용 협의(승인) 및 실시계획 신고 완료
- (송 정 항) 어항개발계획 수립을 위한 관계기관 협의(우리구→부산시)


6 문제점 및 대책

- (미 포 항) 불법매립지(공유수면) 원상회복 의무면제 협의 완료된 중동 1015-9번지 일원 육상기능시설(869m²) 지번 등록을 위한 무주부동산 공고 등(국유재산법 제12조) 행정 절차 이행 기간 장기소요(6개월 이상)
- (청사포항) 제11호 초강력 태풍 “힌남노”에 따른 어항시설 피해(서방파제 파손)

7 향후계획

- 2023년 1월 ~ : 미포항 어항개발계획 수립·고시를 위한 사전행정절차 이행
- 해양공간적합성협의, 재해영향성검토, 해역이용협의 등
- 2023년 6월 : 청사포항 서방파제 연장공사(80m) 완료
- 2023년 1월 : 송정항 어항개발계획 수립·고시(부산광역시)

8 관련 자료

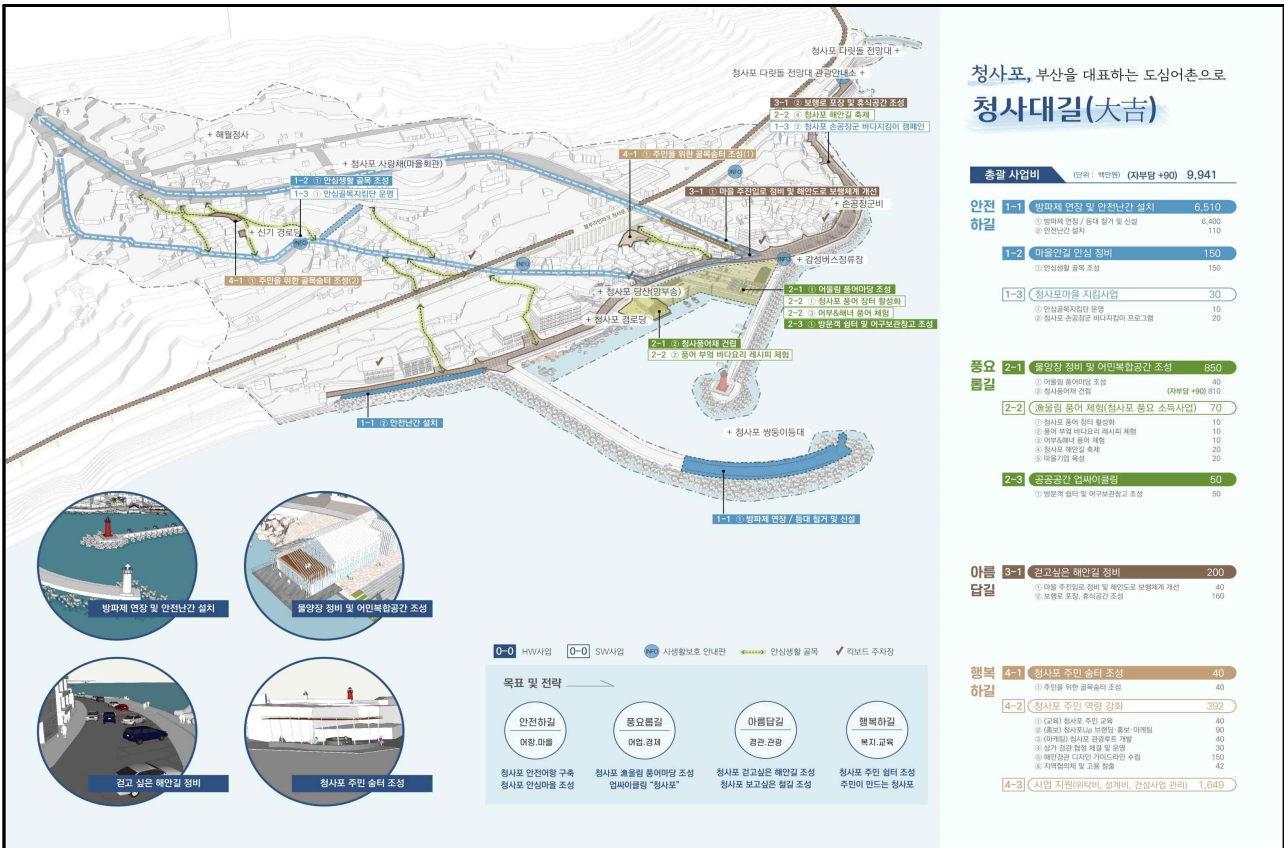

4.1 안전하길(어항, 마을) 청사포 안전어항 구축

1-1 방파제 연장 및 안전난간 설치	
사업	“청사포 청사포도 확보와 안전시설 보강을 통하여 도심어촌으로서 생명기반 안정화”
위 치	청사포항 서방파제 일원
규 모	방파제 80m, 기존 등대 1척
사 업 비	6,400백만원 (예산누당 6,400) - 방파제 80m x 78백만원/m = 6,250백만원 - 기존등대 철거 및 등대 설치 = 150백만원
사업기간	2021년 ~ 2022년(2년) (예산누당 '21 ~ '22)
사업내용	등대 설치와 방파제 연장을 통해 태풍 시 청사포 주민 안전 확보 및 산책·휴식·관광기능 부여
유지관리주체	주관부서: 해양수산부, 지자체: 부산광역시, 사업주관: 부산광역시청, 사업주관: 부산광역시청, 사업주관: 부산광역시청
현황사전	현황사전



① 방파제 연장 / 등대 철거 및 신설

